



REVISION DU SDAGE MARTINIQUE 2022-2027

Point d'avancement CEB 4 juin 2020



SOMMAIRE




1. Vue générale du calendrier *post Covid-19*
2. Zoom sur les avancées et nouveautés
3. Documents accompagnement et PDM
4. Points nécessitant discussion, données manquantes et retours en attente



© Lucas Pelus

1. CALENDRIER

Calendrier national revu / COVID

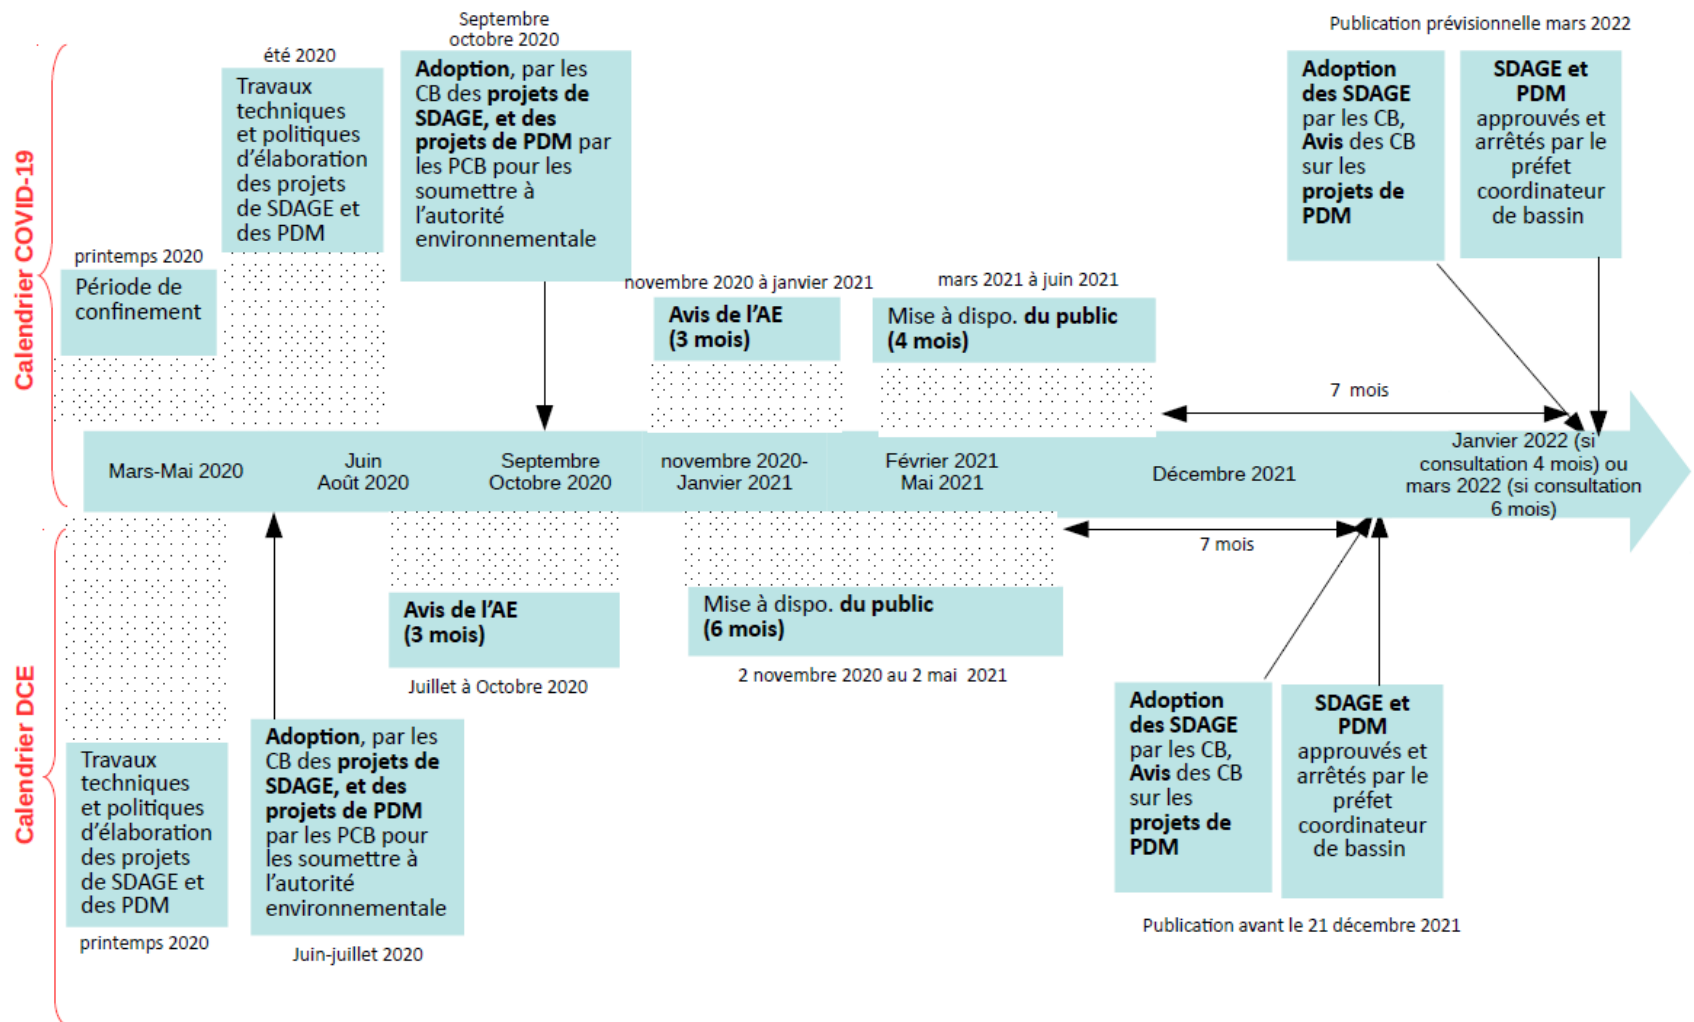

Selon la DCE, la consultation du public doit durer 6 mois et être engagée au moins 1 an avant la période de référence du SDAGE et de son PDM.

Planning du chantier révisé

	Tâches	Septembre				Octobre				Novembre				Décembre				Janvier					Février					Mars				Avril					Mai					Juin				
		37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
Actualisation du SDAGE	Révision du SDAGE																																													
	Mise à jour des Objectifs Environnementaux (2)	manque d'informations sur la définition des objectifs du fait de la fin du cycle en 2027																																												
	Elaboration des documents de synthèse																																													
Documents d'accompagnement	Présentation synthétique de la gestion de l'eau																																													
	Présentation des dispositions en matière de tarification et récupération des coûts (IREEDD)																																													
	Tableau de bord du SDAGE																																													
	Analyse et sécurisation juridique (SCE)																																													
	MAJ de documents (SOCLE, programme de surveillance, MEFM, zones protégées..)																																													
	Résumés et Synthèse (programme de surveillance, PDM..)																																													
Elaboration du PDM, évaluation des coûts du PDM et analyse économique	Identification des mesures																																													
	Dimensionnement du PDM (IREEDD)																																													
	Analyse économique du PDM (IREEDD)																																													
	MAJ de l'état des ME (OPTION)																																													
	Fiches Masses d'Eau																																													
Mise à jour des et finalisation des documents	Intégration des avis de l'AE																																													
	Intégration des avis du Public																																													
Réunions, COPIL, COTECH, CEB	Réunions COTECH (20 réunions)	1				2	3								4					5	6				10	7	8	9	10	11	12															
	Réunions de COPIL																																													
	Ateliers thématiques																																													
	Réunions en CEB																																													

CoVid-19 REPORT

DÉJÀ RÉALISÉ

Octobre à
Dec. 2019

29 Novembre
2019

21 Janvier
2020

12 mars 2020

17 mars
au 11 mai

Janvier à Mai
2020

- **AVANCEMENT CONCERTATION** : Recueil d'informations auprès des acteurs de l'Eau (Questionnaire) envoyés auprès de 30 organismes
- Séminaire des Elus
- Séminaire des acteurs de l'eau
- Atelier du PDM
- **Confinement**
- **RÉDACTION DU SDAGE**: dispositions, texte et orientations et avancement des documents d'accompagnement.

SEMINAIRE DES ELUS

29 novembre 2019

OBJECTIFS : Définir la politique de gestion de l'eau et des milieux aquatiques du prochain SDAGE 2022-2027

- **48 élus présents**, présidé par le Président de l'Office de l'Eau et la Présidente du CEB.

Mais aussi:

	CEB	Chambre consulaire	CTM	EPCI	Maire	Mairie
Nombre de participants	11	1	6	5	3	19

- Réalisation d'interviews de **6 élus** (CEB, CACEM, ODYSSI, CAP NORD, Commune des 3-îlets, Ancien élu)
- Point Presse (France Antilles)
- Film de communication réalisé par l'Office de l'Eau Martinique




ATELIER SDAGE DES ACTEURS DE L'EAU

21 janvier 2020

OBJECTIFS : Travailler sur certaines dispositions bloquantes sur la base de retour du questionnaire.

- **48 acteurs présents**
- 1 journée d'échanges en ateliers (3x1h30) sur un certain nombre de dispositions:
 - 18 dispositions sur l'AC/ANC et l'AEP
 - 20 dispositions sur le Milieu Marin et Trame Verte et Bleue
 - 12 dispositions sur la Gouvernance
 - Transversalité sur le Changement Climatique
- Une synthèse des débats, transmise aux acteurs (diffusion par l'Office de l'Eau)

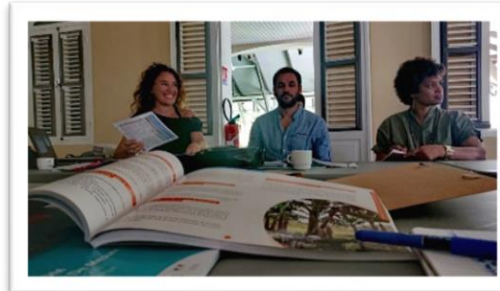

RESTE A REALISER

Fin juin 2020

Juillet 2020

Aout 2020

Septembre
2020

Nov 2020 à
janv 2021

Février 2021

Mars – Juin
2021

Juillet – nov
2021

Décembre
2022

- Rédaction finalisée du SDAGE (Orientation & Dispositions) + avancement des autres documents du SDAGE + avancement du PDM
- Présentation du projet de SDAGE en CEB
- Définition des mesures du PDM (hors coûts)
- Finalisation de l'analyse économique et méthode Analyse Cout Efficacité
- Validation du projet de SDAGE et PDM / présentation V1 au CEB
- Projet de SDAGE soumis à l'Autorité Environnementale AE
- Intégration des avis de l'AE
- Consultation du Public et des acteurs (4 mois)
- Intégration des avis et modifications
- Présentations au CEB / Aller retour
- Adoption SDAGE



© Lucas Pelus



2. AVANCEES & NOUVEAUTE

CONCERTATION DES ACTEURS

ATELIER TECHNIQUE PDM 12 mars 2020

3

OBJECTIFS: définir des actions opérationnelles pour le prochain PDM

➤ **Echange pendant 4h avec 37 acteurs de l'eau sur les points suivants:**

- Rappel du contexte/définition/enjeux,
- Rappel des pressions déclassantes,
- Présentation des actions opérationnelles par masse d'eau,
- Expertise complémentaire par les acteurs présents:
 - Prise en considération d'autres Plans / schémas,
 - Intégration des avis complémentaires,
 - Intégration de nouvelles actions proposées,
 - Débat / échanges.

SEMINAIRE DES ELUS 29 novembre 2019

1

OBJECTIFS : Définir la politique de gestion de l'eau et des milieux aquatiques du prochain SDAGE 2022-2027

- **48 élus présents**, présidé par le Président de l'Office de l'Eau et la Présidente du CEB.

Mais aussi:

	CEB	Chambre consulaire	CTM	EPCI	Maire	Mairie
Nombre de participants	11	1	6	5	3	19

- Réalisation d'interviews de **6 élus** (CEB, CACEM, ODYSSI, CAP NORD, Commune des 3-îlets, Ancien élu)
- Point Presse (France Antilles)
- Film de communication réalisé par l'Office de l'Eau Martinique



ATELIER DES ACTEURS DE L'EAU 21 janvier 2020

2

OBJECTIFS : Travailler sur certaines dispositions bloquantes sur la base de retour du questionnaire.

- **48 acteurs présents**
- 1 journée d'échanges en ateliers (3x1h30) sur un certain nombre de dispositions:
- 18 dispositions sur l'AC/ANC et l'AEP
 - 20 dispositions sur le Milieu Marin et Trame Verte et Bleue
 - 12 dispositions sur la Gouvernance
 - Transversalité sur le Changement Climatique
- Une synthèse des débats, transmise aux acteurs (diffusion par l'Office de l'Eau)



AVANCEMENT DE LA CONCERTATION


➤ 12 COTECH de travail avec l'Office de l'Eau et la DEAL:

- n°1 à 5 : **Démarrage**, programmation, **planification** des séminaires,
- n°6: Thématique **Assainissement** : 05/02/2020
- n°7: Thématique **Milieu Marin** : 14/02/2020
- n°8: Thématique **AEP**: 27/02/2020
- n°9: Thématique **Gouvernance**: 04/03/2020
- n°10: Thématique **Trame Verte et Bleue**: 13/03/2020 (Visio)
- n°11 : **Connaissances et Gouvernance**: 02/04/2020 (Visio)
- n°12 : **Avancement travaux et préparation CEB**: 29/05/2020 (Visio)

➤ 3 COPIL :

- COPIL 1 : Démarrage, méthode, équipe, calendrier: 10/10/19
- COPIL 2 : Avancement des travaux : 14/01/20
- *Confinement 3^e COPIL annulé début avril 2020.*
- COPIL 3 Restreint (présidente CEB / DG ODE) : Choix d'orientation politique : 23/04/20 et 28/04/20 (Visio)
- COPIL 4 : A arrêter (juin)

RAPPEL METHODOLOGIE REVISION DISPOSITIONS SDAGE

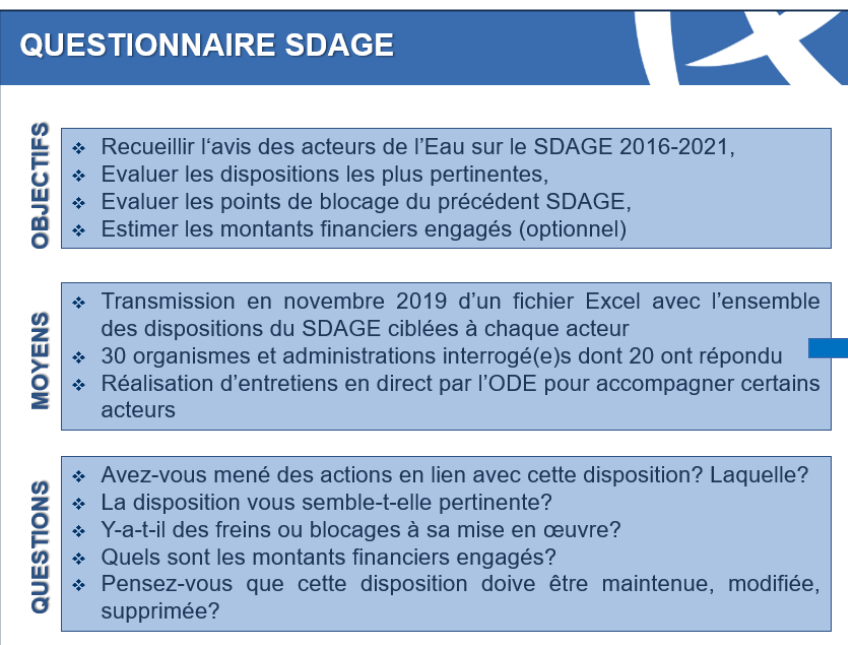

POINT DE BLOCAGES

Bloquantes

Construction des Ateliers Concertations

Propositions pour Echanges et validation COTECH

Mise à jour dispositions ou rédaction nouvelles

VALIDATION COPIL



COPIL = commission technique CEB
 COTECH = ODE DEAL prestataires

DOCUMENT DU SDAGE

MAINTIEN DES ORIENTATIONS SUIVANTES

OF 1

Concilier les usages humains et les besoins aquatiques

- I-A. Mieux connaître l'état de la ressource et de nos prélèvements
- I-B. Mettre en œuvre des actions de gestion durable de la ressource
- I-D. Développer la gouvernance et la solidarité.

OF 2

Reconquérir la qualité de l'eau et des milieux aquatiques

- II-A. Diminuer les pollutions domestiques et urbaines
- II-B. Réduire la pollution diffuse par les substances dangereuses
- II-C. Améliorer les pratiques agricoles
- II-D. Lutter contre l'érosion

OF 3

Protéger et restaurer les milieux aquatiques remarquables

- III-A. Gérer durablement les cours d'eau
- III-B. Préserver le milieu marin
- III-C. Protéger les mangroves et les zones humides
- III-D. Favoriser la gestion concertée et la bonne gouvernance

OF 4

Connaitre pour mieux gérer l'eau sur les comportements

- IV-A. Mieux connaître le fonctionnement des milieux aquatiques
- IV-B. Pour développer des pratiques innovantes ou plus durables
- IV-C. Pour mieux communiquer et agir efficacement sur les comportements



Zoom sur les évolutions du SDAGE

Suites aux ateliers, questionnaires, séminaires et échanges COTECH et COPIL :

- **9 nouvelles Dispositions proposées:** elles sont à valider en COPIL
- **4 dispositions supprimées ou scindées en 2** (A valider en COPIL)

- ⇒ **Thèmes : assainissement : objectif (national) Zéro pression assainissement collectif 2027**
- ⇒ **Concilier les usages (AEP / sécheresse ...)**
- ⇒ **Grand cycle : milieu marin dégradé** (politique de protection plus marquée ?) / Aménagement du territoire
- ⇒ **Intégrer des démarches de politique sociale** (DFAP / solidarité....)
- ⇒ **Prise en compte du Changement Climatique,**

SYNTHESE DISPOSITONS

125

SDAGE 2016-21

125 dispositions étaient inscrites au précédent SDAGE 2016-2021.

93

ACTIONS

Selon les retours du questionnaire, 93 dispositions sur 125 (soit 75%) ont fait l'objet d'actions (selon les acteurs ayant répondu).

70

A MAINTENIR

Selon le retour du questionnaires, 70 dispositions sont à maintenir. Elles ont été reprises et mise à jour (date, réglementation etc..) comme vue lors des ateliers de concertations et COTECH

51

VALIDE COTECH

51 dispositions sont « bloquantes » tant sur la forme que sur le fond et sont donc à revoir en détails en COTECH pour échanges et validation.

9

NOUVELLES

9 nouvelles dispositions sont proposées, issues d'échanges et discussions des COTECH et/ou Ateliers.

5

A SUPPRIMER

5 dispositions sont à supprimer car soit l'opération est réalisée soit elle n'est plus d'actualité

21

VALIDER COPIL

21 dispositions nécessitent une discussion et validation en séance de COPIL, soit car elles sont nouvelles soit qu'elles font l'objet de désaccord ou avis partagés.

131

SDAGE 2022-27

Totalité des dispositions pour le cycle 2022-2027

AVANCEMENT DE LA REDACTION

125	SDAGE 2016-21
93	ACTIONS
70	A MAINTENIR
51	VALIDE COTECH
9	NOUVELLES
5	A SUPPRIMER
21	VALIDER COPIL
131	SDAGE 2022-27

- **Disposition Bloquantes :**

⇒ Reprise des 51 dispositions en ateliers puis re-écriture avec les remarques apportées.

⇒ Totalité des 51 dispositions réécrites présentées et discutées en COTECH.

⇒ 40 dispositions sont finalisées

⇒ 11 dispo sont en attente de retours par mail

- **Dispositions restantes**

⇒ Les 74 autres dispositions ont été actualisées (re-écriture) sur la base des retours des questionnaires et des échanges par mails avec ODE / DEAL / DAAF/ DM et autres acteurs.

- **Relecture juridique**

⇒ Objectifs: éviter remise en cause et contentieux (cf. SDAGE Loire-Bretagne). Démarrée dès le mois de mars 2020.

⇒ 88 dispo sont relues et corrigées

⇒ 32 sont en cours de relecture par SCE ou de corrections

⇒ 11 sont en attentes de validation COPIL d'abord




3. Documents d'accompagnement et PDM

DOCUMENT D'ACCOMPAGNEMENT

DA n°	Titre du document d'accompagnement au SDAGE
1	Présentation synthétique de la gestion de l'eau
2	Disposition de la tarification de l'eau et récupération des coûts
3	Résumé du PDM
4	Résumé du Programme de Surveillance
5	Tableau de Bord des Indicateurs de Suivi
6	Résumé des disposition pour l'information et consultation du public
7	Synthèse des méthodes et critères servant à l'élaboration du SDAGE
8	MAJ des MEFM, projets d'intérêts généraux et registre des zones protégées
9	Actualisation du SOCLE (sur la base doc DEAL 2019). Analyse et sécurisation juridique du SDAGE (vérification légalité et articulation réglementaire)
10	ynthèse du SDAGE (80p)+ synthèse Grand Public (10 pages)

REDACTION DOCUMENT ACCOMPAGNEMENT

- DA n°2 & 9: **finalisés fin mai 2020**
=> à valider par le COTECH/COFIL
- DA n°1, 3, 4, 6, 7,10 : synthèses et résumés de documents tels que PDM, programme, synthèse: **finalisés durant l'été 2020**
- DA n°5: tableau de bord des indicateurs.
=> **Retours DEAL Intégrés.**
=> **En attente de retours et validation de l'ODE.**
- DA n°8: MAJ des MEFM, Programmes d'Intérêt Général Majeur, registres des zones protégées.
=> **Pas de modification à apporter par rapport au précédent SDAGE (hors périmètre de captage?)**

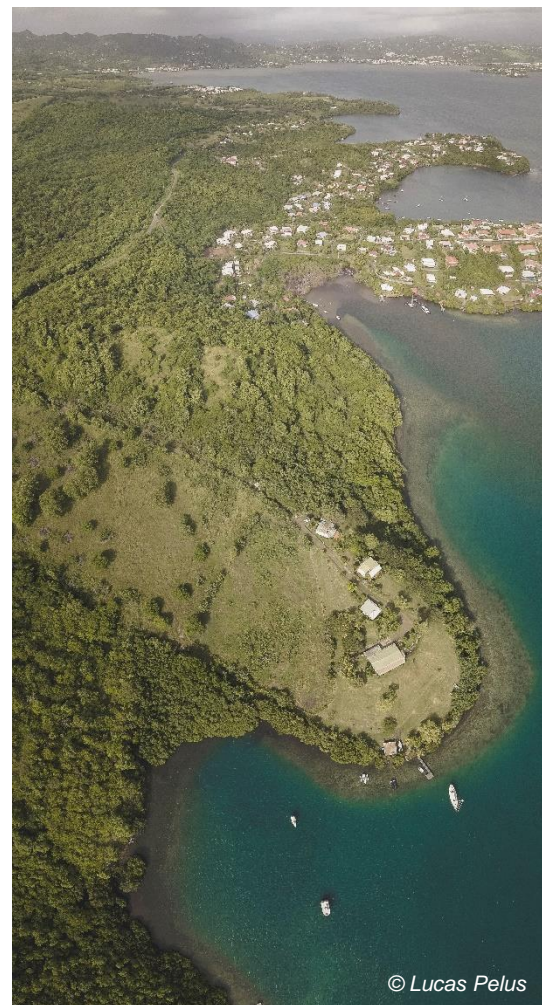

AVANCEMENT REDACTION DU PDM

Prise en compte de toutes les actions techniques et financières engagées dans différents Contrats / Plans et **régionalisation des actions** (à l'échelle de la masse d'eau), à savoir:

- Contrats de Progrès des 3 EPCI;
- Conventions complémentaires EPCI / ODE sur des actions d'assainissement et d'eau potable (pour CAESM et Cap Nord);
- Diagnostic DEAL des ouvrages défectueux (Janvier 2020),
- Plan Eco-Phyto et feuille de route régionale
- Contrats de Milieux:
 - Baie de Fort-de-France (2020),
 - Contrat Littoral Sud,
 - Contrat de rivière du Galion,
 - Pan d'Actions de la rivière d'OMAN,
 - Plan d'Action de la rivière de Case-Navire Aval



AVANCEMENT REDACTION DU PDM

ASSAINISSEMENT: thématique majeure du prochain PDM


- Actions prévues par **CAESM** et **CAP NORD**: réunions de travail/échanges pour spatialiser les travaux et définir les masses d'eau concernées (cours d'eau et côtières).
 - ⇒ Identification des travaux prioritaires de réhabilitation de réseaux,
 - ⇒ Identification des travaux d'extension de réseaux,
 - ⇒ Identification des travaux prioritaires sur les Postes de Refoulement (PR),
 - ⇒ Localisation géographique et linéaire concerné (quand connu)
- En attente des retour de ODYSSI.
- Priorisation sur les ouvrages d'AC définie par la DEAL et géolocalisation des ouvrages « problématiques ».
- Identification des masses d'eau en RNAOE pour prioriser les actions sur ces masses d'eau

AUTRES THEMATIQUES

- En cours d'avancement et d'identification des actions prioritaires sur les thématiques:
 - => Assainissement Autonome
 - => Agriculture
 - => Prélèvements AEP
 - => Prélèvements Irrigation
 - => Produits Phytosanitaires
 - => Espèces Envahissantes
 - => Hydromorphologie »

**MERCI DE VOTRE
ATTENTION**

Gaëlle HIELARD

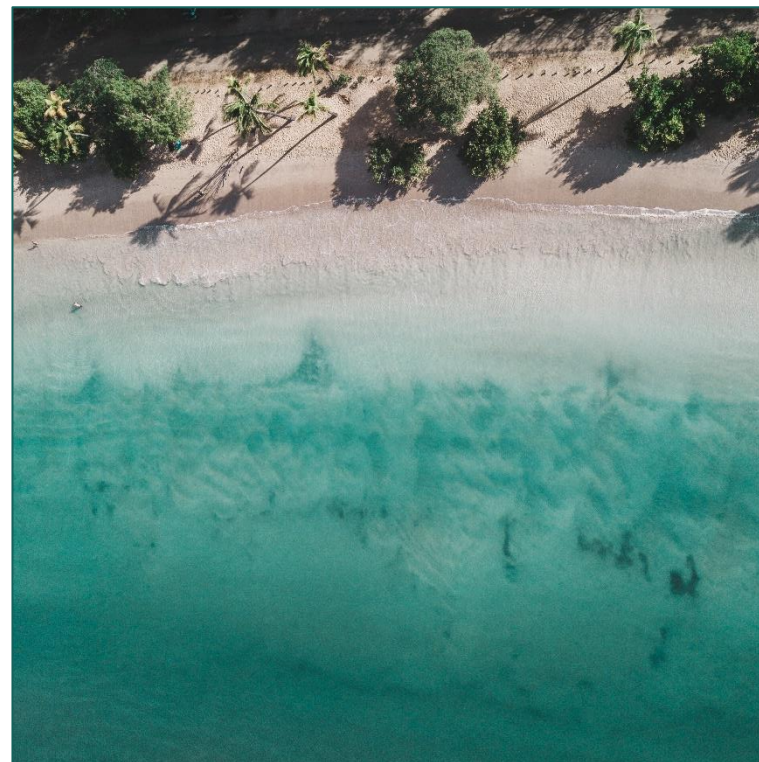

**AGENCE FRANÇAISE
POUR LA BIODIVERSITÉ**
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT





ANNEXES



© Lucas Pelus



AGENCE FRANÇAISE
POUR LA BIODIVERSITÉ
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT



QUESTIONNAIRE SDAGE

OBJECTIFS

- ❖ Recueillir l'avis des acteurs de l'Eau sur le SDAGE 2016-2021,
- ❖ Evaluer les dispositions les plus pertinentes,
- ❖ Evaluer les points de blocage du précédent SDAGE,
- ❖ Estimer les montants financiers engagés (optionnel)

MOYENS

- ❖ Transmission en novembre 2019 d'un fichier Excel avec l'ensemble des dispositions du SDAGE ciblées à chaque acteur
- ❖ 30 organismes et administrations interrogé(e)s dont 20 ont répondu
- ❖ Réalisation d'entretiens en direct par l'ODE pour accompagner certains acteurs

QUESTIONS

- ❖ Avez-vous mené des actions en lien avec cette disposition? Laquelle?
- ❖ La disposition vous semble-t-elle pertinente?
- ❖ Y-a-t-il des freins ou blocages à sa mise en œuvre?
- ❖ Quels sont les montants financiers engagés?
- ❖ Pensez-vous que cette disposition doit être maintenue, modifiée, supprimée?

DOCUMENT DU SDAGE

OF 1

Concilier les usages humains et les besoins aquatiques

- I-A. Mieux connaître l'état de la ressource et de nos prélèvements
- I-B. Mettre en œuvre des actions de gestion durable de la ressource
- I-D. Développer la gouvernance et la solidarité.

OF 2

Reconquérir la qualité de l'eau et des milieux aquatiques

- II-A. Diminuer les pollutions domestiques et urbaines
- II-B. Réduire la pollution diffuse par les substances dangereuses
- II-C. Améliorer les pratiques agricoles
- II-D. Lutter contre l'érosion

OF 3

Protéger et restaurer les milieux aquatiques remarquables

- III-A. Gérer durablement les cours d'eau
- III-B. Préserver le milieu marin
- III-C. Protéger les mangroves et les zones humides
- III-D. Favoriser la gestion concertée et la bonne gouvernance

OF 4

Connaitre pour mieux gérer l'eau sur les comportements

- IV-A. Mieux connaître le fonctionnement des milieux aquatiques
- IV-B. Pour développer des pratiques innovantes ou plus durables
- IV-C. Pour mieux communiquer et agir efficacement sur les comportements



POINT NECESSITANT
DISCUSSION
DONNEES MANQUANTES,
ATTENTE RETOUR

DISPOSITIONS A RELIRE / COMPLETER

- Certaines dispositions ont nécessité des échanges par mail pour relecture, complément et/ou validation. La plus part on reçu les retours attendus. 16 dispositions sont toujours en attentes d'éléments de réponses.
 - 8 dispositions méritent d'être revues en COTECH pour fixer simplement de nouvelles échéances.
 - 3 dispositions doivent faire l'objet de discussion technique en COTECH.
 - 5 dispositions nécessitent la mise à jours de cartes ou nouvelles cartes
 - 21 dispositions doivent être discutées et validées en COPIL.
- => Date du copil de validation à fixer.

	Code Disposition	Quoi?	Qui?
1	Disposition I-A-02	Mail	SNDE
2	Disposition I-A-03	Mail	DEAL / ODE
3	Disposition I-B-01	Mail	ODE
4	Disposition I-D-03	Mail	ODE
5	Disposition I-D-06	Mail	ODE
6	Disposition II-B-05	Mail	DEAL
7	Disposition II-C-03	Mail	DAAF
8	Disposition II-C-05	Mail	DAAF
9	Disposition II-C-08	Mail	ADEME / DAAF / ODE
10	Disposition III-B-02	Mail	PNM / EPCI / ODE
11	Disposition III-B-03	Mail	ODE
12	Disposition IV-A-03	Mail	ODE
13	Disposition IV-A-04	Mail	ODE
14	Disposition IV-A-06-2	Mail	CTM / ODE
15	Disposition IV-A-08	mail	ADEME / ODE
16	Disposition IV-B-02	Mail	ADEM/ CAP NORD / ODE
1	Disposition I-B-05	Échéance	COTECH
2	Disposition I-C-02	Échéance	COTECH
3	Disposition I-C-03	Échéance	COTECH
4	Disposition I-C-05	Échéance	COTECH
5	Disposition I-C-07	Échéance	COTECH
6	Disposition II-A-01	Échéance	COTECH
7	Disposition II-A-05	Échéance	COTECH
8	Disposition II-A-17	Échéance	COTECH
1	Disposition I-D-01	Technique	COTECH
2	Disposition II-A-11	Technique	COTECH
3	Disposition III-C-06	Technique	COTECH
1	Disposition I-A-01	Carte	BET
2	Disposition I-C-10	Carte	BET
3	Disposition II-A-10	Carte	BET
4	Disposition III-C-02	carte	BET / ODE ?
5	Disposition III-C-05	carte	BET / ODE ?

DISPOSITIONS A VALIDER EN COPIL

OF	Etat	Code Disposition	Titre de la Disposition
OF1	Conservée	Disposition I-C-01	Délimiter les aires d'alimentation et prévoir des actions de préservation des captages AEP
	Conservée	Disposition I-C-09	Respecter les règles de répartition et de restriction de l'eau pour tous prélèvements en rivière définies à chaque point nodal
	Conservée	Disposition I-D-02	Mettre en place une gestion unique de l'eau
	Nouvelle	Disposition I-D-07	Mettre en place le Dispositif de Financement de l'Assainissement non collectif pour les Particuliers (DFAP)
OF2	Conservée	Disposition II-A-02	Rendre compatible les objectifs de rejet avec les objectifs de bon état
	Supprimée	Disposition II-A-03	Développer des filières de traitement (pour nouvelle ou ancienne STEP) en fonction de la sensibilité des milieux et respecter les valeurs seuils pour les nouvelles STEP
	Conservée	Disposition II-A-11	Réévaluer le classement en zone sensible de tout ou partie du littoral
	Conservée	Disposition II-A-16	Favoriser la reprise en maîtrise d'ouvrage publique des STEP privées dans le parc collectif
	Conservée	Disposition II-A-17	Promouvoir et accompagner la concertation et la coordination de la gestion des eaux usées
	Conservée	Disposition II-A-18	Mettre en conformité les dispositifs d'assainissement non collectif
OF3	Conservée	Disposition III-A-02	Actualiser les cours d'eau définis en tant que réservoirs biologiques
	Nouvelle	Disposition III-A-06	Limiter la consommation d'espaces naturels et tendre vers le zéro artificialisation nette
	Nouvelle	Disposition III-A-07	Réaliser les études préalables à la mise à jour de la liste de définition des réservoirs biologiques
	Conservée	Disposition III-B-01	Préserver les herbiers de phanérogames marines et les massifs coralliens
	Supprimée	Disposition III-B-9	Étudier l'impact de l'extraction de sédiments sur le milieu marin
OF4	Nouvelle	Disposition IV-A-06-2	Identifier les territoires à risque important d'érosion et construire une stratégie locale de gestion du risque érosion sur ces territoires
	Conservée	Disposition IV-A-07	Améliorer la connaissance de la contamination et des transferts des pesticides (chlordécone notamment) dans les milieux
	Supprimée	Disposition IV-A-6	Renforcer la connaissance des aléas littoraux, identifier les territoires à risque important d'érosion et construire une stratégie locale de gestion du risque érosion sur ces territoires
	Conservée	Disposition IV-B-07	Réouvrir et encadrer la pêche en eau douce
	Nouvelle	Disposition IV-B-09	Inciter les événements et activité de loisirs en milieux aquatiques et marins à atteindre une empreinte carbone et environnementale nulle
	Nouvelle	Disposition IV-C-07	Informier et sensibiliser sur la fonctionnalité et la fragilité des milieux aquatiques : ZH, Sources, ripisylves
